


Samenwerkingsagenda

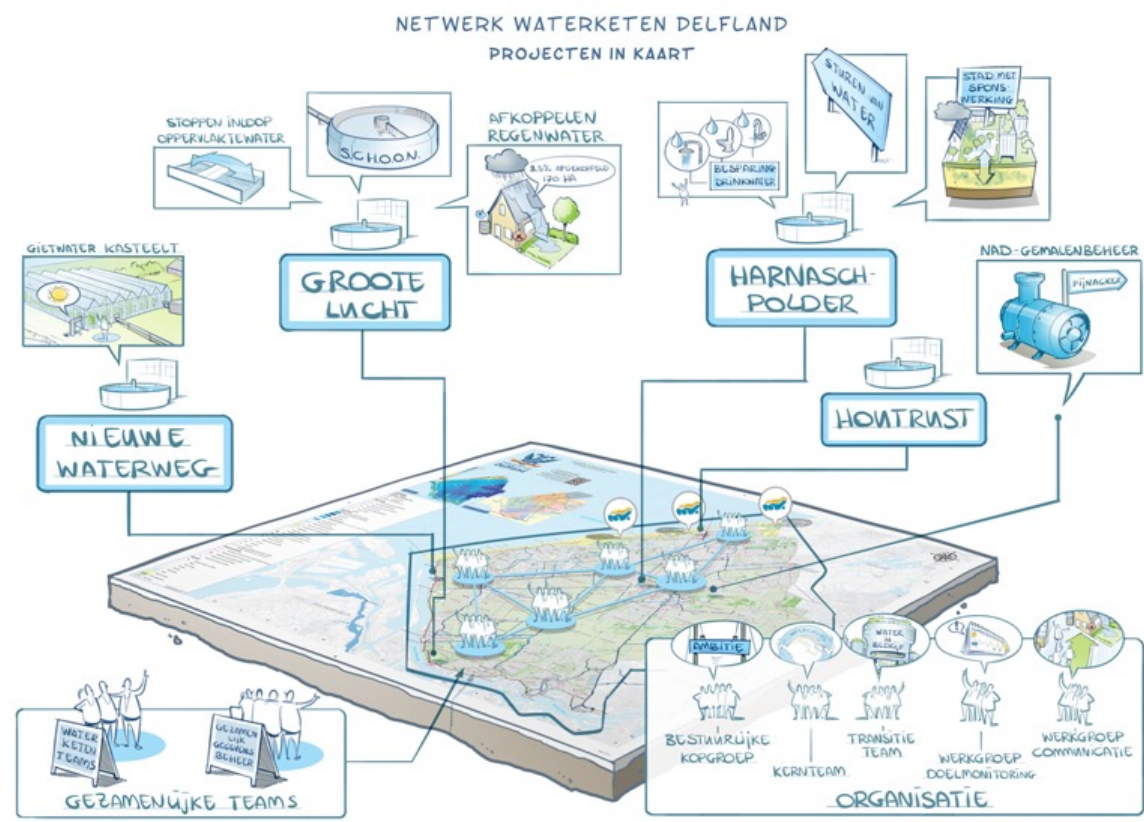

Agenda

- 09.00 u Inleiding
- 09.20 u 0-meting
- 09.35 u Meten en monitoren
- 10.05 u Pauze - 10 min
- 10.15 u Werken aan je projectblad in break-out rooms
- 10.45 u Terugkoppeling plenair en gesprek
- 10.55 u Rondvraag en afsluiting

Waar staan we nu?

- Samenwerkingsagenda bestuurlijk overeenkomst
- Veel lopende projecten
- Enkele nieuwe projecten
- Basis vastleggen
 - Trekkers van projecten
 - Projectblad en ontsluiten op de website
 - Meten en monitoren

Rapportage pagina

- Waarvoor doen we het / aan wie rapporteren we?
- Op welke onderdelen willen jullie rapporteren? / aan welke behoefte willen we voldoen?

Rapportage: Project X										
Naam Project	Status	Omvang	Voortgang (Reden Kort)	Geld	Organisatie	Tijd	Informatie	Kwaliteit	Risico	
Project X	Escaleren	Groot	Te weinig capaciteit, einddatum nadert	Budget is opgehoogd met €50.000 is geaccepteerd door de financierende partijen	Komen te weinig resources beschikbaar deelnemende gemeentes zijn kwetsbaar	Lopen volledig uit de planning door tekort aan resources	Geen opm.	Voldoen ondanks tegenslag nog steeds aan de verwachte kwaliteit maar niet binnen planning	Voldoen ondanks tegenslag nog steeds aan de verwachte kwaliteit maar niet binnen planning	
			●	● ↑	●	●	●	☹	☹	
		Huidig		Voorstel (Projectleider)				Goedgekeurd		
Initiele startdatum	uit templ			Nieuwe startdatum				Aangepaste startdatum		
Initiele einddatum	uit templ			Nieuwe einddatum				Aangepaste einddatum		
Initieel Budget	uit templ	150.000		Nieuw Budget	200.000			Aangepast Budget	200.000	
Voortgang (behaalde mijlpalen en highlights)							Escaleren Ja/Nee	Ja/Nee		
Onze Mijlpalen gehaald ondanks de tekorten aan capaciteit. Zien wel problemen voor de laatste stappen							Gevraagd besluit of gevraagde escalatie		Besluitvormend gremium	
							Zie hierboven voor aanpassingen in data of Budget			
							Toelichting op gevraagde aanpassingen in het project of GOTIK aspecten			
							Toelichting op veranderingen van de initiele project uitgangspunten (bv aanpassingen in de doelstellingen of resultaten)			
							Akkoord ja/nee		Ja/Nee	

- Frequentie: per trimester omdat er ook 3 watertafels zijn? / Per kwartaal? / Per maand?

Overzichtspagina NAD projecten

Overzichtspagina NAD projecten													
Naam Project	Korte omschrijving	Naam project/ trekker	Status	Omvang	Voortgang	Mijlpalen/ voortgang	Reden Kort	Geld	Organisatie	Tijd	Informatie	Kwaliteit	Risico
Gemalen beheer	Opzetten gezamenlijk gemalen beheer tussen gemeentes	Harrie Nak	Afgerond	Groot	😊	Uitvoerin gestart, veel positieve reacties	Te weinig capaciteit, einddatum nadert	🟢 →	😊	🔴	🟢	🟢	🟢
OAS Grote Lucht			In afronding	Midden	🟢	mijlpalen gehaald en leuke highlights	volgens plan	🟢 →	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Omgevingswet			Lopend	Klein	🔴	uitgesteld	kwaliteit laag	🟢 ↑	🔴	🔴	🟢	🔴	🔴
Water cyclusbedrijf			In wacht		😊		Geen capaciteit	🟢	🔴	🟢	😊	🟢	🟢
Wijk van de toekomst			In voorbereiding	Groot	🟢	Wordt met veel enthousiasme aan gewerkt	Opstart loopt gesmeerd	🟢 →					
Gezamenlijke uitingen in de media			Gestopt	Groot	😊	Veel artikelen gepubliceerd en leuke reacties	Te weinig capaciteit, project gestopt	😊 →	🔴	😊	😊	😊	😊
Watercyclus bedrijf			Geagendeerd	Midden									
Project X			Escaleren	Groot	🔴	Geen voortgang	Te weinig capaciteit, einddatum nadert	🟢 ↑	🔴	🔴	🟢	😊	😊

Deze pagina is een samenvatting van de rapportage die door de projectleiders of trekkers worden ingevuld in een template (website?).

- Het “projectblad” wordt zichtbaar als je op de projectnaam klikt
- De pagina waarop de voortgang wordt vastgehouden kan je benaderen door op de [Reden kort](#) te klikken

Rapportage aan de BWT/ externe website?

- Deze is een ingeklapte versie van de “overzichtspagina NAD projecten”

Overzichtspagina NAD projecten							
Naam Project	Korte omschrijving	Naam project/ trekker	Status	Omvang	Voortgang	Mijlpalen/ voortgang	Reden Kort
Gemalen beheer	Opzetten gezamenlijk gemalen beheer tussen gemeentes	Harrie Nak	Afgerond	Groot	☹️	Uitvoerin gestart, veel positieve reacties	Te weinig capaciteit, einddatum nadert
OAS Grote Lucht Omgevingswet			In afronding	Midden	😊	mijlpalen gehaald en leuke highlights	volgens plan
Water cyclusbedrijf			Lopend	Klein	☹️	uitgesteld	kwaliteit laag
Water cyclusbedrijf			In wacht		☹️		Geen capaciteit
Wijk van de toekomst			In voorbereiding	Groot	😊	Wordt met veel enthousiasme aan gewerkt	Opstart loopt gesmeerd
Gezamenlijke uitingen in de media			Gestopt	Groot	☹️	Veel artikelen gepubliceerd en leuke reacties	Te weinig capaciteit, project gestopt
Watercyclus bedrijf			Geagendeerd	Midden			
Project X			Escaleren	Groot	☹️	Geen voortgang	Te weinig capaciteit, einddatum nadert
